

PLAN DESMANTELAMIENTO DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO Y DE RESTAURACIÓN DEL TERRENO Y SU ENTORNO

INDICE

1.- GENERALIDADES

- 1.1.- Objeto
- 1.2.- Titular y promotor de la instalación
- 1.3.- Emplazamiento
- 1.4.- Normativa de aplicación

2.- CENTRAL FOTOVOLTAICA

- 2.1.- Descripción de la planta fotovoltaica
 - 2.1.1.- Configuración de la planta
 - 2.1.2.- Descripción de equipos que conforman la central
- 2.2.- Descripción de la obra civil.
 - 2.2.1.- Movimiento de tierras
 - 2.2.2.- Caminos y accesos
 - 2.2.3.- Drenajes
 - 2.2.4.- Zanjas
 - 2.2.5.- Arquetas
 - 2.2.6.- Vallado perimetral
 - 2.2.7.- Cimentación estructura
- 2.3.- Estado previo de los terrenos.
 - 2.3.1.- Descripción urbanística
 - 2.3.2.- Topografía

3.- PLAN DE DESMANTELAMIENTO

- 3.1.- Desmontaje de módulos fotovoltaicos
- 3.2.- Desmontaje de estructuras
- 3.3.- Desmontaje de circuitos eléctricos
- 3.4.- Desmontaje de centro de transformación
- 3.5.- Desmontaje de los sistemas de vigilancia, control, medida y alumbrado
- 3.6.- Eliminación de infraestructuras y cimentaciones
- 3.7.- Desmontaje de vallado perimetral
- 3.8.- Eliminación de viales

4.- RECICLADO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

- 4.1.- Introducción
- 4.2.- Productor de residuos
- 4.3.- Residuos de construcción y demolición
- 4.4.- Prevención
- 4.5.- Reutilización, valorización, eliminación
- 4.6.- Separación de residuos en obra
- 4.7.- Emplazamiento
- 4.8.- Valoración
- 4.9.- Obligaciones del poseedor de residuos

5.- RESTAURACIÓN Y/O REPOSICIÓN FINAL

- 5.1.- Restauración de perfiles, cimentaciones y suelos
- 5.2.- Cimentaciones
- 5.3.- Arquetas de líneas de media tensión subterráneas
- 5.4.- Viales de acceso
- 5.5.- Revegetación

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

7.- CONCLUSIÓN

1.-GENERALIDADES

1.1.- Objeto

La última fase del proyecto de una central fotovoltaica, una vez finalizada la fase de explotación y la vida útil de sus componentes, es la de desmantelamiento. El objeto del presente documento es describir y justificar esta fase del parque solar fotovoltaico y así dar cumplimiento al Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, en el que se especifica la obligación de elaborar un plan de desmantelamiento para los parques solares fotovoltaicos. Asegurando así, el correcto procedimiento y adecuación del emplazamiento a origen donde está ubicada la central y su entorno, una vez finalizada la actividad de generación de energía eléctrica.

1.2.- Titular y promotor

El titular y promotor de la central fotovoltaica es VF RENOVABLES 21, S.L., con CIF B44521037, y con domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Casalduch, nº 36, bajo. 1 2005 - Castellón de la Plana (Castellón), empresa dedicada a la promoción y construcción de parques solares fotovoltaicos.

1.3.- Emplazamiento

El terreno se halla ubicado en Polígono 14, Parcela 93 de la localidad de Sierra d'en Galceran, provincia de Castellón. Las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 del centroide de los terrenos donde se encontrará ubicada la actividad fotovoltaica corresponde con: 3 1 T, 245276.57 m E, 4459065.27 m N.

Se podrá acceder a las distintas áreas que componen la planta fotovoltaica, desde el vial acondicionado a tal efecto.

1.4.- Normativa de aplicación

La normativa de aplicación a tener en cuenta para el desmantelamiento de la central fotovoltaica se enumera, en orden cronológico, a continuación:

- o **Real Decreto 105/2008**, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- o **Directiva 2012/19/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- o **Real Decreto 110/2015**, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- o **Orden APM/1007/2017**, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
- o **Decreto 55/2019**, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana.
- o **Decreto Ley 14/2020**, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

2.-CENTRAL FOTOVOLTAICA

2.1.- Descripción de la central fotovoltaica

2.1.1 – Configuración de la instalación fotovoltaica

La Instalación Fotovoltaica sobre terreno, de conexión a red responde al siguiente esquema: el generador fotovoltaico está formado por una serie de módulos conectados eléctricamente entre sí, formando "strings" o cadenas de 28 paneles. Estos se agrupan en paralelo, hasta llegar a la etapa de conversión de potencia. Debido a que no es posible inyectar directamente la energía de la central fotovoltaica a la red eléctrica, se precisa ser transformada en corriente alterna apta para acoplarse a la misma, tanto en tensión como en frecuencia.

Para conseguir esta transformación, esta corriente se conduce al inversor correspondiente, encargado de realizar la conversión. Posteriormente se conduce esta energía al transformador de potencia, situado en el Centro de Transformación (CT), donde se convierte a la misma tensión que la red eléctrica y de este modo puede ser conducida a través de la red de distribución a la tensión y frecuencia requeridas. Esta conducción se conseguirá mediante las líneas de Media Tensión (MT) que se unirán de manera radial o en anillo los centros formando circuitos de MT, hasta alcanzar el punto de enlace con la red de distribución.

La planta fotovoltaica contará con los siguientes equipos principales:

- 43.488 módulos fotovoltaicos Jinko Solar JKM460-7RL3 de 460 Wp.
- Estructuras metálicas del fabricante PRAXIA ENERGY, S.L.
- 5 Inversores del fabricante y modelo: Power Electronics HEMK FRAME 2.
- 5 Centros de Transformación (edificio prefabricado), con transformadores de 4.000 kVA y uno de 3200kVA y sus correspondientes celdas de posición.

2.1.2 – Descripción de equipos que conforman el parque fotovoltaico

Módulo fotovoltaico


El módulo fotovoltaico utilizado para la instalación solar es el modelo Jinko Solar JKM460-7RL3 y posee las siguientes especificaciones:



SPECIFICATIONS

Module Type	JKM460M-7RL3 JKM460M-7RL3-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	460Wp	342Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	43.24V	39.75V
Maximum Power Current (Imp)	10.64A	8.61A
Open-circuit Voltage (Voc)	51.90V	48.88V
Short-circuit Current (Isc)	11.50A	9.29A
Module Efficiency STC (%)	20.49%	
Operating Temperature(°C)	-40°C~+85°C	
Maximum system voltage	1000/1500VDC (IEC)	
Maximum series fuse rating	20A	
Power tolerance	0~+3%	
Temperature coefficients of Pmax	-0.35%/°C	
Temperature coefficients of Voc	-0.28%/°C	
Temperature coefficients of Isc	0.048%/°C	
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2°C	

De la misma forma, se detallan las dimensiones y características constructivas del modelo:

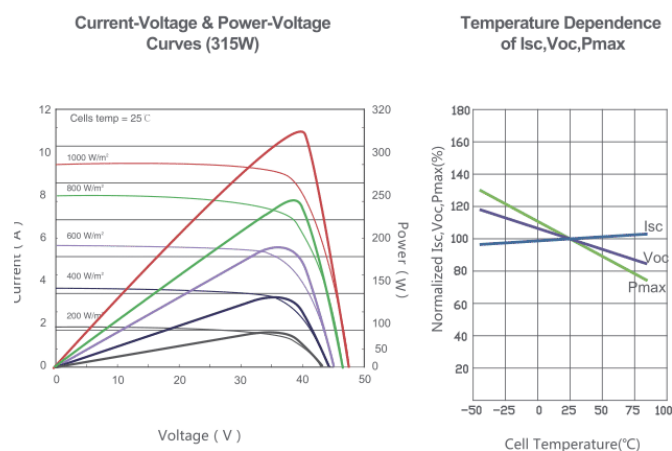

Estructura soporte

En el momento de la redacción del presente proyecto la estructura de los paneles será del fabricante PRAXIA ENERGY, S.L., las características principales se resumen a continuación:

Se trata de una estructura sobre suelo, biposte, con 2 módulos en vertical, con capacidad para situar un total de 28 módulos por estructura y a 29° de inclinación, de hincado directo, con perfil en "c" y fijación de panel mediante grapa.

Los materiales utilizados para la estructura serán aceros S250 GD, S280 GD y galvanizados siderúrgicos a base de tratamientos superficiales por inmersión en Zinc. Para la tornillería de los paneles se utilizará preferentemente aceros inoxidable tipo AISI 304 A2 u otra aleación que mejore las características de comportamiento frente a la humedad.

Inversor

Los inversores que se van a utilizar en la planta son el modelo Power Electronics HEMK FRAME 2



Algunas de las protecciones que lleva el propio inversor son las que se detallan:

CONTROL INTERFACE	Communication protocol	Modbus TCP
	Plant Controller Communication	Optional
	Keyed ON/OFF switch	Standard
PROTECTIONS	Ground Fault Protection	GFDI and Isolation monitoring device
	General AC Protection	Circuit Breaker
	General DC Protection	Fuses
	Overvoltage Protection	AC, DC Inverter and auxiliary supply type 2

Centro de Transformación

El centro de transformación de corriente alterna que se va a utilizar es un centro prefabricado de hormigón del fabricante INAEL, con máquina estática de IMEFY sobre cubeta metálica de seguridad.

2.2.- Descripción de la obra civil

2.2.1 – Movimiento de tierras

El movimiento de tierras a realizar será el mínimo necesario para la adecuación mediante excavación y relleno de las zonas de instalación de módulos y centros, así como para la construcción de los caminos interiores que ofrecen acceso a los diferentes puntos singulares del parque.

También se realizará un desbroce únicamente en las zonas que sea necesario, aunque en principio, sería suficiente con el despeje de la zona arrancando arbustos de gran tamaño y el talado de árboles existentes.

2.2.2 – Caminos y accesos

La planta fotovoltaica dispondrá de una red de caminos internos y aprovechará parte del trazado de caminos existentes en la zona de implantación. Los caminos tienen como misión el conformar una red viaria que sirva para acceder a los distintos elementos que conforman la planta. A través de los caminos se dotará a la planta de distintos puntos de acceso para optimizar la explotación de la misma y facilitar las labores de mantenimiento.

2.2.3 – Drenajes

En su caso, se dotará de una red de drenaje al conjunto de la planta fotovoltaica para canalizar la escorrentía de la zona hacia puntos de desagüe natural y dar continuidad a los cursos de agua permanentes en la zona.

2.2.4 – Zanjas

Baja Tensión

Las dimensiones de las zanjas de Baja Tensión dependen del número de circuitos que alojen y oscilan entre los 0,65 m - 1,00 m de profundidad y los 0,40 m - 0,80 m de anchura.

Además de los circuitos, las zanjas llevarán instalado la red de comunicaciones por fibra óptica, cables de datos, alimentación en su caso y red de puesta a tierra.

Media Tensión

Las dimensiones de las zanjas de Media Tensión dependerán también del número de circuitos que alojen y su profundidad dependerá también de los coeficientes correctores aplicados según las características de su ubicación.

2.2.5 – Arquetas

Las arquetas serán independientes para cada tipo de instalación, por lo tanto, se utilizarán varios tipos diferentes de arquetas, éstas son: para circuitos de Baja Tensión, para circuitos de Media Tensión, para Comunicación y para vigilancia.

2.2.6 – Vallado perimetral

Se ejecutará un vallado metálico perimetral cuyo trazado seguirá la implantación de las distintas áreas ocupadas por los módulos fotovoltaicos y los caminos internos, de conformidad con la normativa urbanística del municipio donde se emplaza la planta fotovoltaica.

Ocasionalmente el vallado recorrerá la totalidad de la parcela contratada, aunque no esté ocupada en su totalidad por módulos o caminos.

2.2.7 – Cimentación estructura

A falta de estudio geotécnico de detalle que confirme las condiciones del terreno existente se optará por una cimentación mediante hinca directa de perfilera metálica.

Se realizará previamente ensayos in-situ bajos las condiciones establecidas en CTE y UNE correspondiente, así como cumplir los requerimientos específicos de los esfuerzos a los que estará sometido el pilar durante la vida útil de la estructura.

2.3.- Estado previo de los terrenos

2.3.1 – Descripción urbanística

Se definen los diferentes tipos de superficies:

- Superficie catastral: Suma de las áreas de las parcelas catastrales en donde se ejecuta la planta fotovoltaica.
- Superficie de Ocupación: Área delimitada por el perímetro del vallado.

- Superficie Construida: Área que engloba el perímetro de las estructuras, y Centros de Transformación.
- Superficie de Captación: Área de módulos instalados.

En nuestra planta hay un total de 921.853 m² de superficie catastral de las cuáles se ocupará 256.909,02 m² (vallado). De la superficie ocupada habrá 87.578,6 m² de superficie de captación.

Según la normativa urbanística vigente, las parcelas escogidas para la instalación se encuentran en suelo no urbanizable común.

2.3.2 – Topografía

La topografía del terreno se ha extraído de la Infraestructura valenciana de Dades Espacials, de donde se ha obtenido la triangulación del modelo digital del terreno (MDT), realizada en el sistema ETRS89 FUS 30 a partir de los datos del proyecto PNOA LIDAR de los años 2009 y 2015 actualizados a partir del vuelo fotogramétrico de l'ICV de 2017.

La información necesaria del terreno también se ha consultado de la cartografía disponible en la web de la Generalitat Valenciana.

En general, se observa una topografía más abrupta en la zona norte de la parcela, zona de terreno forestal, y desciende la pendiente hacia el sur empleando el método de escalonamiento de bancales.

3.-PLAN DE DESMANTELAMIENTO

3.1 – Desmontaje de módulos fotovoltaicos

En primer lugar, se procederá a desmontar los módulos fotovoltaicos de las estructuras soporte a las que están sujetos. Hay que tener en cuenta que están unidos por tornillería de seguridad en las cuatro esquinas de su marco y por pinzas de sujeción por lo que, una vez se libere los tornillos de sujeción con herramientas adecuadas, se abrirán las sujeciones y se extraerá el panel.

Una vez desmontados, para determinar su destino final, se tendrá en cuenta su estado de funcionamiento ya que normalmente nos encontraremos con módulos fotovoltaicos con un rendimiento más bajo del inicial, pudiendo llegar a valores del 20%, pero que producirán energía, en cualquier

caso. En placas bajo estas condiciones, se procederá a almacenarlos para su reutilización en otras instalaciones, donde los requerimientos tener un servicio de energía eléctrica se pondera más que los criterios de maximizar potencia y minimizar pérdidas en parques fotovoltaicos.

En caso de no ser posible su reutilización, serán transportados a gestor autorizado para la elaboración de nuevos productos.

3.2 - Desmontaje de estructuras

Debido a que las estructuras están montadas a base de tornillería, el proceso de retirada es muy simple, consistiendo únicamente en el desmontaje de la tornillería.

Para el desmantelamiento de las estructuras metálicas, en primer lugar, se desmontará la estructura metálica con los paneles fotovoltaicos y una vez en el suelo se procederá a desarmarla. Los módulos fotovoltaicos serán desconectados, desarmados y se procederá con ellos según se explica en el apartado anterior.

Los materiales desmontados de las estructuras metálicas serán trasladados a un lugar adecuado para su disposición, reutilización o en su caso reciclados.

Las cimentaciones de las estructuras serán a base de perfiles hincados directamente sobre terreno, de forma que no se generan residuos de hormigón. Para su desmantelamiento será preciso su extracción con medios mecánicos.

Los perfiles metálicos que se obtienen, se acopiarán y se cargarán en un camión con la ayuda de una carretilla elevadora y/o un camión grúa para que, posteriormente, sean trasladados a la gestora de residuos metálicos más próxima.

3.3 - Desmontaje de circuitos eléctricos

En la instalación eléctrica se puede considerar distintos tramos: un primer tramo de interconexión entre módulos con cables fijos a la estructura, un segundo tramo, desde las estructuras hasta la etapa de inversión, un tercer tramo, desde el inversor hasta el CT y finalmente el cableado de MT. Estos dos últimos tramos se encuentran en una red de canalizaciones o zanjas subterráneas con el cable tendido directamente en zanja.

Por lo tanto, primeramente, se procederá a la desconexión por corte del cableado de interconexión de módulos fotovoltaicos que ya se habrá realizado con el desmantelamiento de los

módulos. Los cables se quitarán de la estructura soporte y se almacenarán en zona segura para su traslado.

Una vez realizado, se desmontarán los tramos enterrados mediante la excavación de las zanjas, luego se sacarán los cables del interior de las zanjas o tubos y se almacenarán al igual que los anteriores. Paralelamente, se recuperarán las cajas de conexiones, registros, arquetas y elementos auxiliares de las canalizaciones.

Los conductores se entregarán a un gestor autorizado de residuos eléctricos y electrónicos y el cobre será tratado como corresponde a cada residuo según su clasificación.

Por último, habrá que restituir las zonas afectadas del terreno, huecos de arquetas y zanjas de canalizaciones, mediante relleno con tierra natural.

3.4 – Desmontaje de Centro de Transformación

En un primer paso se deberán aislar eléctricamente los transformadores eléctricos y serán trasladados para su posterior utilización y, si ésta no es posible, se llevarán a vertedero autorizado.

3.5 – Desmontaje de sistemas de vigilancia, control, medida y alumbrado

Se procederá al desmantelamiento del interior de las casetas donde se alojan los equipos de vigilancia, seguridad, control, medida y centralización de contadores. Así como también, el circuito de alumbrado interior. Estos residuos se entregarán al gestor de residuos eléctricos y electrónicos.

En la caseta donde se encuentra la centralización de contadores también se desmontará la caja precintada con los equipos electrónicos de medición, caja de fusibles, interruptor general manual, etc.

3.6 – Eliminación de infraestructuras y cimentaciones

Una vez retirados todos aquellos equipos susceptibles de reutilización y desmontadas las instalaciones, se procederá a la retirada de las casetas y de las losas de cimentación.

Respecto a las casetas, se procederá al desmontaje de la cubierta y los cerramientos, posteriormente se eliminarán los perfiles metálicos mediante corte de los mismos. La losa de hormigón será demolida mediante martillo neumático hasta que quede reducida a escombros.

Los elementos metálicos serán depositados en plantas de reciclaje y los escombros generados serán trasladados a la planta de reciclado de escombros y restos de obra.

Las arquetas también se añadirán a los residuos metálicos férreos.

3.7 – Desmontaje de vallado perimetral

En el desmontaje del vallado perimetral se llevará a cabo por personal cualificado que se encargará de retirar los postes y vallas metálicas. Para los dados de cimentación donde se montan los postes se demolerán con martillo neumático, en su caso.

Los residuos generados serán, preferentemente, de naturaleza férrea y escombros de las cimentaciones que serán tratados de igual forma que los resultantes del resto del desmantelamiento de la instalación.

3.8 – Eliminación de viales

Será necesaria eliminación de aquellos viales no existentes en la zona de actuación en el estado de origen, siempre y cuando los servicios forestales no expresen su deseo de contar con ellos en el futuro o por deseo expreso de los servicios técnicos municipales.

La eliminación de los viales se realizará según el siguiente proceso:

- En caso de existir, se desbrozará la vegetación presente en los desmontes y terraplenes.
- Se retirarán las capas de zahorra compactada, hasta una cota de 30 cm bajo el terreno.
- Se rellenarán cunetas y desmontes y se suavizará el terreno afectado dejando la orografía lo más suave y parecida al estado pre-operacional posible.

4.-RECICLADO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

4.1. Introducción

Este apartado se realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Se debe tener en cuenta la posible reutilización de los elementos y materiales resultantes del desmantelamiento del parque solar fotovoltaico.

En primer lugar, aclarar que durante el desmantelamiento de la instalación no se generarán residuos tóxicos o peligrosos.

Para el caso de los paneles fotovoltaicos, una vez desmontados de las estructuras, se procederá a su traslado a un centro de tratamiento y reciclado que garantice su eliminación sin perjuicios para el medio ambiente. Los módulos que estén en buen estado se pueden contemplar su aprovechamiento en instalaciones rurales que no precisen de tanta potencia.

Los componentes de la instalación eléctrica del parque, serán trasladados a centros donde se reciclarán sus componentes para su reutilización.

Para el resto de elementos susceptibles de ser reciclados como pueden ser estructuras soporte, sistema de vigilancia, control, medida, alumbrado, vallado, etc. se reciclarán, siendo materias primas para la elaboración de nuevos componentes y acero, respectivamente.

Las tierras procedentes de los movimientos de tierras necesarios para la extracción de las canalizaciones subterráneas se acopiarán para su posterior uso en el rellenado de las mismas.

El proceso de reciclaje y su posterior uso, puede cambiar en el futuro, debido a los avances tecnológicos.

4.2. Productor de residuos

De acuerdo con el art. 2 letra e del RD, se define como productor de residuos de construcción y demolición a la "Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición". Dentro de esta última condición se encuentra el promotor de las obras descritas en el presente proyecto.

4.3. Residuos de construcción y demolición

De acuerdo con la definición (art.2 letra a) del Real Decreto, cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición de "Residuo" incluida en el artículo 3ª) de la Ley 10/1998 de 21 de abril, y concordantes se genere en una obra de construcción y demolición, merece la consideración de "residuo de construcción y demolición".

En el parque fotovoltaico no hay demolición de edificios, puesto que se trata de unas parcelas dedicadas, hasta ahora a cultivo, no existiendo ningún tipo de construcción que deba ser demolida, por lo que no se generará ningún tipo de residuo al respecto.

Se procederá a realizar un movimiento de tierras para adecuar, en lo posible, el terreno a la nueva actividad, aprovechando la tierra sobrante de unas zonas, para colocarla en las zonas

en las que se precise realizar un relleno de la misma tierra, por lo que estas tareas no generarán ningún tipo de residuos.

Las obras descritas en el presente proyecto consisten esencialmente en el acondicionamiento de unas parcelas de terreno no urbano destinadas para la instalación de una huerta solar fotovoltaica situada en Polígono 14, Parcela 93 de la población de Serra d'en Galceran, provincia de Castellón. La previsión que se hace respecto a la producción periódica de residuos de construcción y demolición es la siguiente:

Código LER	Descripción	Procedencia	Cantidad
170101	Hormigón	Centros prefabricados, losas y bloques vallado.	< 0,75 Tm.
170102	Ladrillos	Arquetas, actividades auxiliares	< 0,25 Tm
170405	Hierro y acero	En elementos Estructuras, centro	< 0,40 Tm.
170402	Aluminio	Grapas y accesorios	350 Kg.
140601	Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC	Celdas de MT	1680 litros
170411	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	Mangueras y cables eléctricos	100000 Kg.
160214	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13	Módulos fotovoltaicos	43488 Ud.

Se debe indicar que el residuo 140601, Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC de las celdas de MT se encuentra confinado en carcasa estanca y, tal como indica el fabricante se encuentra confinado de por vida, se deberá llevar estos elementos a gestor autorizado en caso de no ser posible su reutilización.

En ningún momento de la realización del desmantelamiento de la instalación se alcanzarán las cantidades de residuos estipuladas en el apartado 5 del artículo 5 del RD105/2008, por esta razón se efectuará el transporte periódicamente a gestor autorizado.

4.4. Prevención

Se prevé, como se ha indicado, una escasa producción de residuos, y en una parte muy importante procedente de embalajes, cuya prevención queda fuera del alcance del constructor, por lo que la labor de prevención en la producción de residuos se limitará a aplicar la mayor diligencia en la utilización de los materiales de obra, evitando restos y sobrantes en la mayor medida posible.

4.5. Reutilización, valorización, eliminación

De acuerdo con el escaso volumen de residuos producido, se procederá a su recogida y entrega a un gestor autorizado.

4.6. Separación de residuos en obra

En aplicación de lo indicado en el art. 5.5. del Real Decreto 105/2008, y considerando las cantidades previstas de producción de residuos diferenciados, existe obligación de proceder a la separación de las fracciones indicadas.

4.7. Emplazamiento

A los efectos del almacenamiento y manejo de los residuos de construcción, el contratista deberá acondicionar una zona próxima a la entrada en las parcelas objeto de esta instalación.

4.8. Valoración

El coste del tratamiento previsto de los residuos se ha incorporado a los precios de las unidades de obra que los generan.

4.9. Obligaciones del poseedor de residuos

El contratista adjudicatario, en su calidad de Poseedor de residuos de construcción y demolición (art.2.f del RD), deberá presentar a la propiedad de la obra un plan en el que se reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que el incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, que pasará a formar parte del contrato una vez sea aprobado por la dirección facultativa y aprobado por la propiedad.

Como indica el art. 5.3 del RD, la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá constar en documento fehaciente, en el que figure la identificación del poseedor y productor, la obra de procedencia, la cantidad entregada, el tipo de

residuos entregados codificado de acuerdo con la lista de la orden MAM/304/2002, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. Si el gestor al que se entregan los residuos realiza únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de residuos.

5.-RESTAURACIÓN Y/O REPOSICIÓN FINAL

5.1 – Restauración de perfiles, cimentaciones y suelos

Una vez realizadas las demoliciones y desmantelamientos previstos en los apartados anteriores, se tienen unos huecos o afecciones correspondientes a la demolición de cimentaciones, soleras y arquetas y unas zonas correspondientes a los viales de acceso.

La recuperación de estas superficies pasa por la restauración topográfica, en la medida de lo posible sin aportes externos de materiales, y del suelo, como paso previo a la revegetación y con el objetivo de devolver el suelo a su estado y uso inicial, siendo este predominantemente agrícola.

5.2 – Cimentaciones

Los huecos originados por la demolición y retirada de los escombros de las cimentaciones de las estructuras y distintos elementos serán rellenados con tierra de la propia zona que se extenderá de forma manual y/o mecánica.

5.3 – Arquetas de líneas de media tensión subterráneas

Los huecos de profundidad originados por la retirada de tapas y de la demolición de arquetas dependerá del tamaño de cada arqueta. En este caso la restauración del suelo consiste en rellenar manualmente el hueco con tierra vegetal hasta el nivel de rasante del mismo.

5.4 – Viales de acceso

No se prevé la existencia de muros de contención, escolleras o tuberías de drenaje en los viales. En caso de existir algún elemento de este tipo sería necesario un estudio de estabilidad y/o modificación del drenaje previo a cualquier intervención en los mismos.

5.5 – Revegetación

Con la revegetación se pretende, a corto plazo, evitar la erosión y conseguir la integración paisajística; y, a medio, la restitución de la vegetación autóctona.

6.-PLAZO DE EJECUCIÓN

Finalmente, se adjunta el cronograma que indica el plazo estimado de ejecución del desmantelamiento y la restauración final:

TAREAS	SEMANAS															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Desmontaje de módulos fotovoltaicos	■	■	■	■	■											
Desmontaje de inversores y cajas		■	■	■	■											
Desmontaje de estructuras soporte		■	■	■	■	■	■									
Retirada de los circuitos eléctricos				■	■	■	■									
Desmontaje de interior de centros							■	■								
Desmontaje de sistemas de televigilancia, control y medida								■	■							
Demolición de losas									■	■	■					
Desmontaje de vallado perimetral									■	■	■	■				
Restauración a origen									■	■	■	■	■	■	■	■

7.-CONCLUSIÓN

Se considera que con la descripción que antecede se consigue dar una idea clara de los elementos y condiciones para ejecutar el Plan de desmantelamiento del parque fotovoltaico una vez concluido el periodo de Autorización de explotación, estando dispuesto además a aportar cuantos datos y aclaraciones se consideren necesarios para la concesión del dictamen favorable y como consecuencia los permisos, autorizaciones y condicionantes para la instalación que se solicita.

Castelló de la Plana, a 14 de septiembre de 2020

José Fidel Roig Agut,
Ingeniero Técnico Industrial,
colegiado nº 379
