

CHECK-LIST SEGUIMIENTO Cantera ADZAILA Pego (1ª FASE)

ACTIVIDAD	CONTINUO	DIARIA	SEMANAL	MENSUAL	SEMESTRAL	VOLADURAS	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	Observaciones
Plan de seguimiento y control ambiental				X	X		14/06							Elaborada Ed. 01
Check-list de seguimiento			X	X	X		14/06	09/08	04/09	3/10	29/11			15: Resgisto Idem Anterior
Revisión fosa séptica			X											
Evacuación de las aguas residuales a un depósito impermeable y tratamiento por gestor autorizado.*		X												
Plan de labores (seguimiento)				X	X		28/02	28/08						
Inspección visual de los procesos erosivos e inestabilidades				X	X		Sin cambios							
Vigilancia del avance de los frentes				X	X		Sin cambios							
Estabilización y compactación de pistas de transporte y acopios				X	X		Sin cambios							
Riego periódico de pistas de transporte y acopios.*		X	X											Riego diario llevada a cabo. Induidos e Informe
Planificación y control del tráfico de los vehículos de transporte.*	X	X												Asfaltado y señalización vertical y horizontal. Induidos e Informe
Reducción de la velocidad de circulación, evitando los cruces de pistas.*	X	X												Sin cambios
Mantenimiento de la maquinaria fuera de la zona de trabajo, en un lugar habilitado para ello.*		X												Sin cambios
Vigilancia de la circulación de maquinaria fuera de las zonas no aptas.*	X	X												Sin cambios
Seguimiento de labores de restauración con estado fitosanitario de los individuos (plantas) introducidos				X	X		1/02	29/11						Se actualiza cronograma
Remoción acopios tierra vegetal				X	X		Sin cambios							
Limpieza y saneo de zanjas de drenaje				X	X		Sin cambios							
Mediciones focos difusos y foco canalizado				X	X		Sin cambios							
Control de la presión filtro de mangas.*		X					Sin cambios							
Informe medición de emisiones a la atmósfera				X	X		Sin cambios							
Medición ruido y vibraciones				X	X		Sin cambios							
Informe mediciones de ruido y vibraciones				X	X		Sin cambios							
Revisión de la recogida de residuos en el punto limpio y tratamiento por gestor autorizado.*		X												Residuos retirados el 02/08/2023
Recogida selectiva de los residuos de los trabajadores y gestión en origen.*		X												Sin cambios
Control del viento (condiciones meteorológicas)						X								
Seguimiento del Plan de seguimiento de aceptación social					X		Sin cambios							
Informe medioambiental				X	X		29/11							

* NOTA: En todos los seguimientos de periodicidad diaria, tan solo se anotará cuando haya una incidencia/observación, indicando fecha de esta y su contenido.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS LABORES

Cantera de "Adzaila" Nº 107 PEGO (Alicante).



Pego, 24 de noviembre de 2023

REDACTORES DEL INFORME	
<p>Jaime Soria Herrero Ingeniero de Minas Jefe de Producción de Árido</p>	<p>Teresa Romero Prieto Ingeniero de Minas Delegada de áridos de Levante Norte</p>

Índice

1.	FRENTE DE EXPLOTACIÓN	3	■
1.1.	VIGILANCIA DEL AVANCE DE LOS FRENTE	3	■
1.2.	PROCESOS EROSIVOS E INESTABILIDADES EN LAS ZONAS EXPLOTADAS	3	■
2.	ASFALTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	3	■
3.	ZONAS DE CIRCULACION	5	■
3.1.	REACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE TRÁFICO TRAS VARIOS AÑOS PARADAS.....	5	■
3.2.	CONTROL DEL TRÁFICO RODADO (VELOCIDAD, ZONAS DE CIRCULACIÓN)	5	■
4.	ACOPIOS.....	6	■
4.1.	RIEGO DE ACOPIOS.....	6	■
4.2.	ZONAS DE ACOPIOS.....	6	■
5.	TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES	6	■
6.	RIEGO DE PISTAS	6	■
7.	ACONDICIONAMIENTO PARA ACCESO A PARTE SUPERIOR DEL FRENTE	7	■

1. FRENTES DE EXPLOTACIÓN

1.1. VIGILANCIA DEL AVANCE DE LOS FRENTES

No hay cambios respecto al informe anterior.

1.2. PROCESOS EROSIVOS E INESTABILIDADES EN LAS ZONAS EXPLOTADAS

En caso de observarse, durante los trabajos diarios, cualquier movimiento que pueda comprometer la estabilidad de la plataforma de trabajo, frentes o accesos por parte de cualquier trabajador se comunicara la misma al encargado de forma inmediata, evaluándose la misma a la mayor brevedad llegando a detener los trabajos en este punto hasta la solución de la incidencia detectada.

Durante este mes no se ha detectado ninguna inestabilidad en los frentes.


2. ASFALTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Durante este mes se ha procedido a los trabajos de asfaltado en la planta de tratamiento.

Se ha asfaltado aquellas zonas de tránsito de camiones, para evitar de este modo que se genere polvo al circular camiones por el interior de la planta. El tránsito de camiones vendrá motivado por las operaciones de carga desde los silos.

Se adjuntan fotografías de los trabajos y plano de superficie de la zona asfaltada.



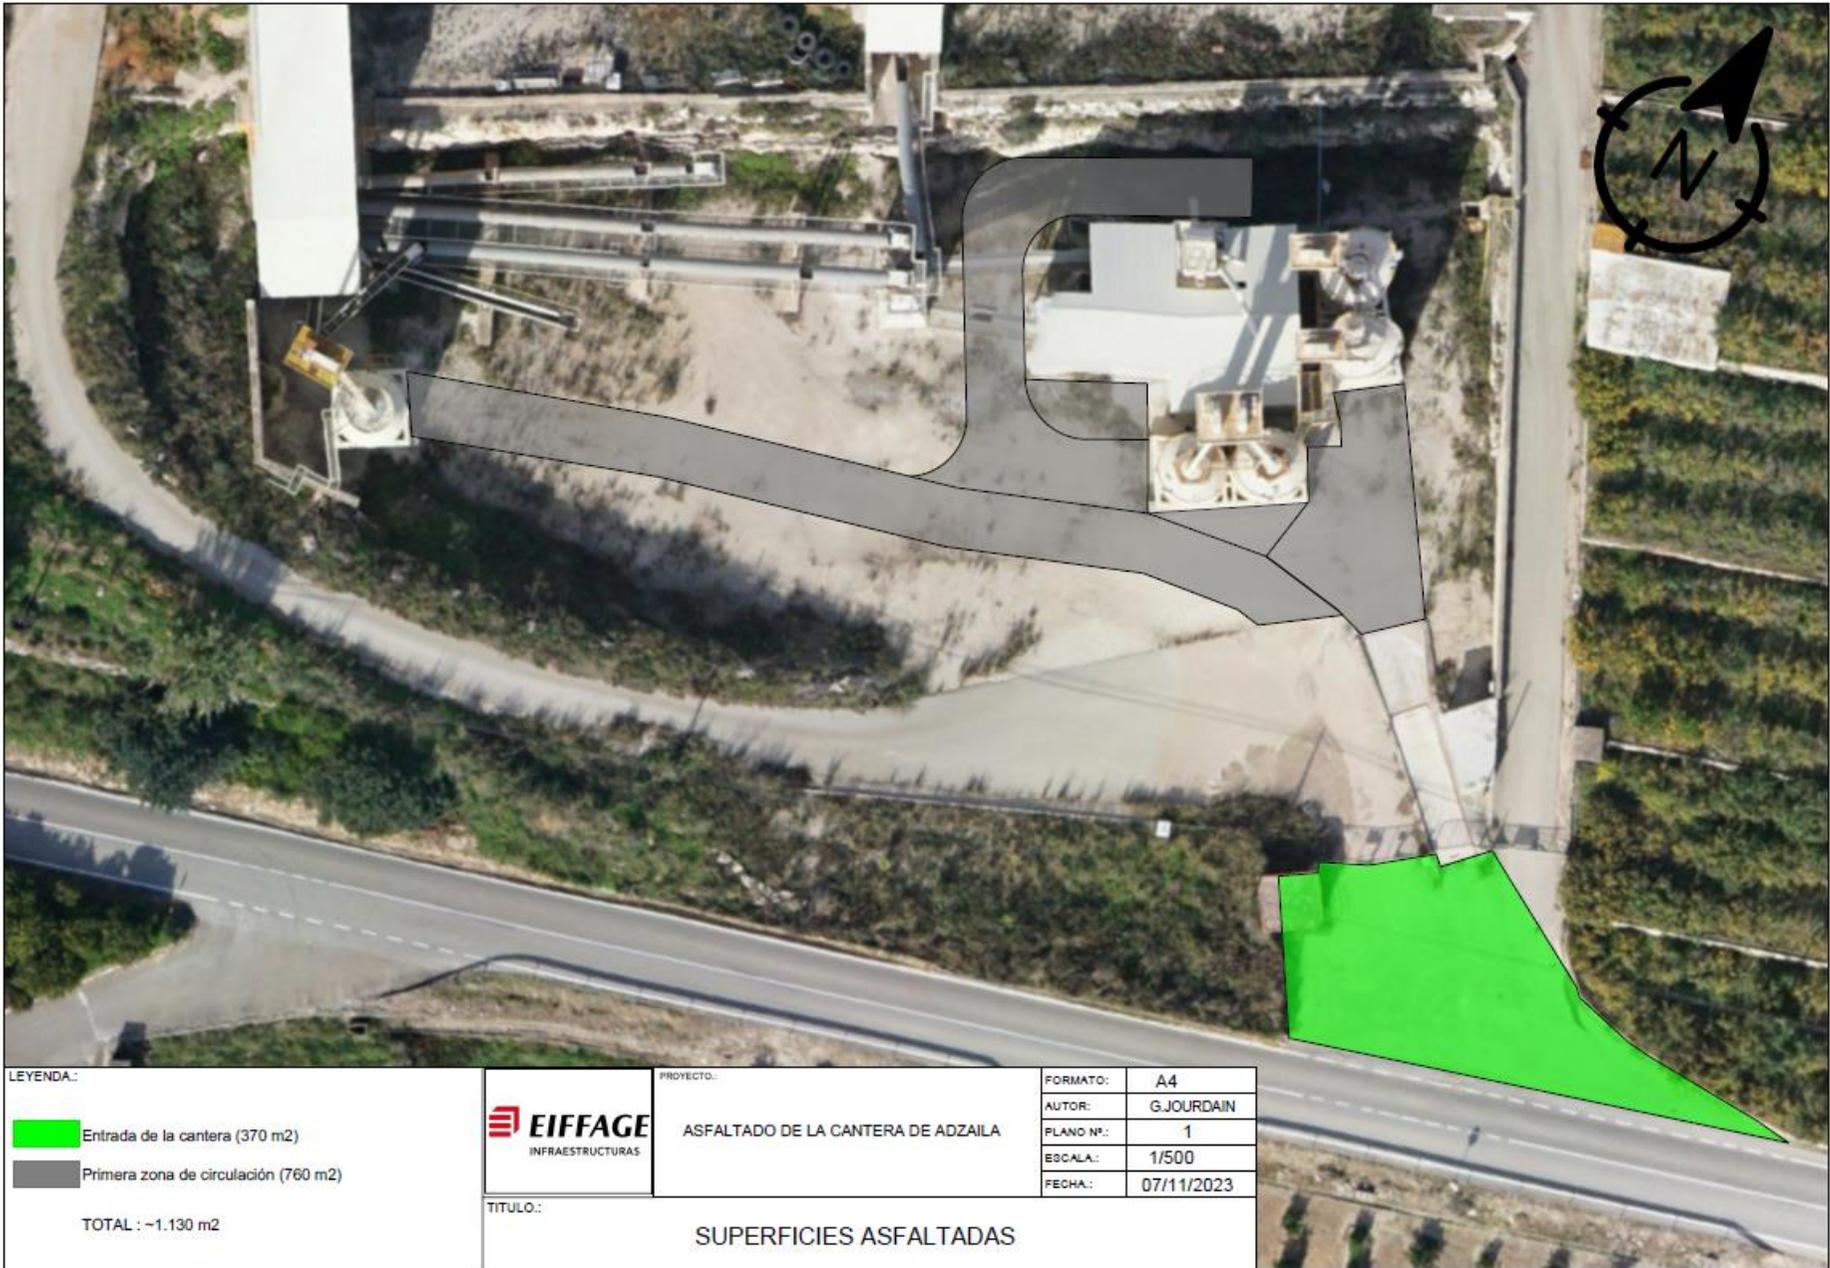

3. ZONAS DE CIRCULACION

3.1. REACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE TRÁFICO TRAS VARIOS AÑOS PARADAS

Durante este mes, se ha continuado con el mantenimiento de toda la zona de tráfico acondicionada anteriormente.

3.2. CONTROL DEL TRÁFICO RODADO (VELOCIDAD, ZONAS DE CIRCULACIÓN)

Durante este mes, se ha llevado a cabo la adecuación del acceso desde la CV-700 a la cantera, según informe favorable de carreteras de octubre 2022.

Se adjuntan fotos, con la señalización:





4. ACOPIOS

No hay cambios respecto al informe anterior.

4.1. RIEGO DE ACOPIOS

No hay cambios respecto al informe anterior.

4.2. ZONAS DE ACOPIOS

No hay cambios respecto al informe anterior.



5. TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES

Se continúa con los trabajos previos de adecuación realizados en las instalaciones, necesarios para su legalización.

Además, para poder adecuar la instalación a las exigencias medioambientales, y poder comprobar la eficacia y eficiencia de las medidas correctoras instaladas, se ha continuado con las pruebas en las instalaciones.

6. RIEGO DE PISTAS

Durante todos los días se ha estado procediendo al riego de las pistas por donde circula la maquinaria y vehículos.

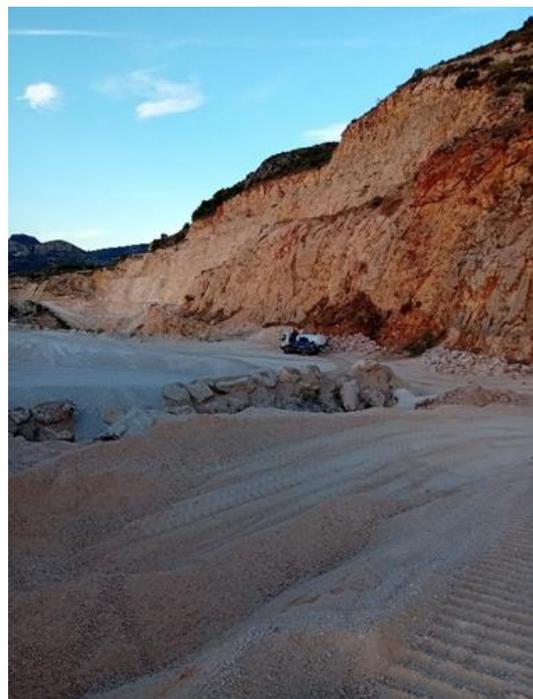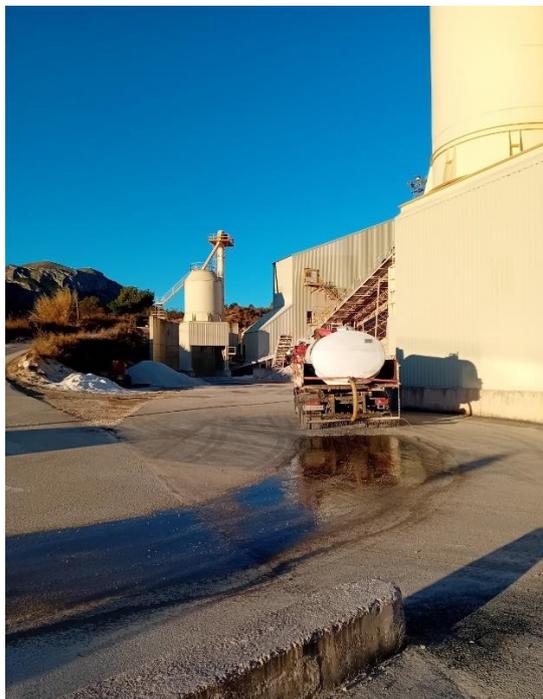

7. ACONDICIONAMIENTO PARA ACCESO A PARTE SUPERIOR DEL FRENTE

Se continúa con los trabajos de acondicionamiento del acceso en el lado Este de la cantera.



CRONOGRAMA INICIO ACTUACIONES RESTAURACION CANTERA ADZAILA 107

PROGRAMA ACTUACIONES PRI-2019. FASE 1 DURACION 3 AÑOS

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	4 T2024	1 SEM 2025	2 SEM 2025	1 SEM 2026	2 SEM 2026
Establecimiento pantallas vegetales naturales:														
PANTALLA 1														
Selección ubicación definitiva en cantera														
Preparacion del suelo, aporte 30 cm esteril + 50cm de tierra														
Ahoyado (unos dias antes de plantar)*														
Plantación y riego de arraigo*														
Riegos (+15 días 1º + 30 días del primero)							**							
Mantenimiento (reposicion de marras, tratamientos fitosanitarios...)														
Restauracion zonas externas al perimetro:														
ATZÚBIA														
Adecuacion geomorfologica del relieve previsto														
Cunetas perimetrales. Red de drenaje														
Preparacion del suelo, subsolado superficial. Aporte tierra vegetal														
Revegetación con especies forestales*														
Riegos de arraigo							**							
Mantenimiento (reposicion de marras, tratamientos fitosanitarios...)														
Bancos finales explotacion-restauracion Fase 1 Norte														
LABORES PREPARATORIAS CAMINO ACCESO NORTE														
Actuaciones compensatorias: descabezado y formacion de tacones														
Cunetas perimetrales. Red de drenaje														
BERMAS ZONA NORTE (175-165)														
Actuaciones compensatorias: descabezado y formacion de tacones														
Cunetas perimetrales. Red de drenaje														
Microvoladuras en bermas 175 y 165														
Preparacion del suelo, subsolado superficial. Aporte tierra vegetal														
Revegetación con especies forestales*														
Riegos de arraigo														
Mantenimiento (reposicion de marras, tratamientos fitosanitarios...)														

* la realización depende de las condiciones climatológicas de la zona

** la frecuencia de los riegos podrá aumentarse según de las condiciones climatológicas y el estado de la revegetacion

1 el inicio depende de la obtencion de la licencia en el ayuntamiento de Atzubia

CRONOGRAMA INICIO ACTUACIONES RESTAURACION CANTERA ADZAILA 107
