

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Cantera de "Adzaila 107"



Pego, septiembre de 2023

Eduardo José Fernández Bustillo Consejero Delegado Eiffage Infraestructuras, SAU	REDACTORES DEL INFORME
	Director Equipo: Santiago Soravilla Hernández Ingeniero Técnico de Minas Colegiado Nº 943 Equipo Redactor: Yolanda López Peydró Ingeniero Técnico Agrícola Irene Torres Campos Lcda. En Ciencias Ambientales Esther García Granero Ingeniera en Recursos Minerales y Energía

Contenido

1.	ANTECEDENTES	4
1.1.	IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.	4
1.2.	REPRESENTANTES.....	4
2.	OBJETO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	5
3.	PUNTOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	6
3.1.	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL	6
3.2.	VACIADO DE FOSA SÉPTICA Y TRATAMIENTO EN EDAR.	6
3.3.	SEGUIMIENTO DE LAS LABORES.	6
3.4.	CONTROL DE LA RESTAURACIÓN DE LA CANTERA.....	6
3.5.	RED DE DRENAJE: ESTADO Y FUNCIONAMIENTO.	6
3.6.	AUTORIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA, LIBRO DE CONTROL.....	7
3.7.	CONTROL DE LAS EMISIONES ACÚSTICAS.....	7
3.8.	CONTROL DE LAS VIBRACIONES	7
3.9.	CONTROL DE LOS RESIDUOS (TÓXICOS Y PELIGROSOS).	9
3.10.	CONTROL DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS.....	9
3.11.	CONTROL DE CONDICIONES DE SOSIEGO DE LA POBLACIÓN AFECTADA.....	9
3.12.	CONTROL DE LA VEGETACIÓN, FAUNA Y PAISAJE	9
4.	CONCLUSIONES.....	10
5.	ANEXOS	10
5.1.	ANEXO 1. CHECK-LIST	10

5.2. ANEXO 2. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LABORES..... 10



1. ANTECEDENTES

La mercantil EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U con CIF: A-41441122, domicilio fiscal C/ Polígono Industrial. Carretera de la Isla, parcela E.L.-3 (Carretera El Copero-esquina calle Río Viejo), 41.703 DOS HERMANAS (Sevilla), es titular de la concesión del derecho minero de explotación y aprovechamiento denominada Adzaila N° 107.

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

Titular: EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U

NIF: A-41441122

DOMICILIO SOCIAL:

C/ Polígono Industrial. Carretera de la Isla, parcela E.L.-3

(Carretera El Copero-esquina calle Río Viejo),

41.703 DOS HERMANAS (Sevilla).

1.2. REPRESENTANTES.

Datos Personales: Eduardo José Fernández Bustillo	Datos Personales: Santiago Soravilla Hernández	Datos Personales: Teresa Romero Prieto
DNI: 34937192-P	DNI: 21483100-L	DNI: 00824770-J
Consejero Delegado de Eiffage Infraestructuras, S.A.U.	Director Facultativo de la Cantera Adzaila. Ingeniero Técnico de Minas, Colegiado N° 943	Delegada de Áridos de Levante Norte de Eiffage Infraestructuras, S.A.U.
Teléfono: (95) 461 04 00/510 35 25	Teléfono: (96) 512 02 51	Teléfono: 647 365 747

2. OBJETO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

El presente Informe trata de realizar el seguimiento del contenido de los documentos ambientales y del apartado SEGUNDO de la parte dispositiva de la **Declaración de Impacto Ambiental (DIA)**, en lo que se refiere al punto 7.5) El Informe Técnico (previsto en el Plan de seguimiento y control).

El pasado 4 de septiembre, se aportó al expediente MIPLAN/2023/19/03 del Plan de Labores de Pego Nº de REGISTRO GVRTE/2023/3681473, el Informe de seguimiento ambiental Nº 2 ADZAILA, en cumplimiento con el punto 7.5) El Informe Técnico (previsto en el Plan de seguimiento y control) de la DIA, con toda la información del seguimiento y control llevado a cabo en la explotación.

En la actualidad se aporta el siguiente informe con toda la información del seguimiento y control llevado a cabo en la explotación hasta el 22 de septiembre del presente.

3. PUNTOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

A continuación, se realiza la revisión de todos los puntos en cumplimiento de la DIA.

3.1. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

Continua en vigor el Plan de Seguimiento y Control Ambiental Edición: 01 (PCA Adzaila) de junio 2023 que ya se adjuntó y se adjunta el check-list de este tercer mes (se adjunta ANEXO 1).

3.2. VACIADO DE FOSA SÉPTICA Y TRATAMIENTO EN EDAR.

No hay cambios respecto a los informes anteriores y ya fue aportada la Autorización de vertido de lodos de FOSA SÉPTICA a EDAR, otorgada por EPSAR (Entitat de Sanejament d'Aigües).

3.3. SEGUIMIENTO DE LAS LABORES.

Durante este mes, cabe indicar que, hasta el momento, no ha habido restauración ni producción, se adjunta el Informe de las labores realizadas (ANEXO 2).

Se ha aportado al expediente del Plan de Labores MIPLAN/2023/19/03, el pasado 28 de julio un nuevo plano de las zonas afectadas por las labores previstas con informe del director facultativo.

3.4. CONTROL DE LA RESTAURACIÓN DE LA CANTERA.

Durante este mes, cabe indicar que, hasta el momento, no ha habido restauración la cantera todavía no se ha puesto en funcionamiento, se han continuado realizado tareas de mantenimiento y puesta a punto.

Respecto a la restauración, no hay modificaciones respecto al cronograma de actuaciones propuesto para su inicio ya presentado que continua en vigor.

3.5. RED DE DRENAJE: ESTADO Y FUNCIONAMIENTO.

Las tareas de este mes se han centrado en mantener limpia la RED de DRENAJE.

3.6. AUTORIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA, LIBRO DE CONTROL.

Con fecha 27 de junio de 2023 se recibió la Resolución de la Autorización Administrativa de Medio Ambiente para Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (APCA) (que ya se aportó), con número de expediente 003/13/AEA a EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y NIMA: 0300007640, también se aportó el contrato con ECMCA para las mediciones establecidas en el CAPCA.

Se implementó un sistema de riego portátil como medida correctora para emisiones de polvo que ya se presentó

Hasta el momento no ha habido producción, la planta todavía no se ha puesto en funcionamiento, durante este mes no se han realizado mediciones.

3.7. CONTROL DE LAS EMISIONES ACÚSTICAS.

Según establece la DÍA, la determinación del cumplimiento de los niveles sonoros se distinguirá entre los niveles sonoros generados por las actividades habituales y las voladuras:

<ul style="list-style-type: none"> Las actividades habituales deberán cumplir, en todo caso, los niveles sonoros del ambiente exterior establecidos en la tabla 1 del anexo I de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uso dominante</th> <th>Nivel sonoro dB(A) Día</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sanitario y docente</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Residencial</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Terciario</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	Uso dominante	Nivel sonoro dB(A) Día	Sanitario y docente	45	Residencial	55	Terciario	65	Industrial	70
	Uso dominante	Nivel sonoro dB(A) Día									
Sanitario y docente	45										
Residencial	55										
Terciario	65										
Industrial	70										
<ul style="list-style-type: none"> En las voladuras, de acuerdo con la disposición adicional primera punto 3 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, teniendo en cuenta la duración y frecuencia de las voladuras, se permite excepcionalmente y exclusivamente para el intervalo de la voladura, un nivel máximo de recepción externo incrementado en 45 dB en relación con lo establecido en la tabla 1 del anexo II. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uso dominante</th> <th>Nivel sonoro dB(A) Día</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sanitario y docente</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Residencial</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Terciario</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	Uso dominante	Nivel sonoro dB(A) Día	Sanitario y docente	90	Residencial	100	Terciario	110	Industrial	120
Uso dominante	Nivel sonoro dB(A) Día										
Sanitario y docente	90										
Residencial	100										
Terciario	110										
Industrial	120										

Hasta el momento, no ha habido producción, la planta todavía no se ha puesto en funcionamiento.

Este mes no se ha realizado ninguna medición.

3.8. CONTROL DE LAS VIBRACIONES

Según establece la DÍA, a efectos de fijar los valores límite para determinar el cumplimiento de los niveles de **vibraciones** medidos in situ se distinguirá entre vibraciones estacionarias y vibraciones transitorias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17b) del R.D.1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Los valores del índice de vibraciones L_{aw} , serán evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV de dicho R.D. y cumplirán los siguientes parámetros:

a) En relación con las vibraciones estacionarias que incluirán las labores diarias y habituales de la actividad (todas excepto las voladuras).

Ninguno de los valores del índice medido in situ superará los siguientes valores:

Uso del edificio	Indice de vibracion L_{aw}
Vivienda o uso residencial	75
hospitalario	72
Educativo o cultural	72

b) Vibraciones transitorias considerando como tales las voladuras:

Los niveles establecidos en el apartado a) podrán superarse para el conjunto de voladuras efectuadas en 6 meses, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

b1) Las voladuras se efectuarán, en todo caso, en horario diurno reducido establecido para las actividades ruidosas (ver condicionante de horario), esto es, en la franja horaria comprendida en el siguiente rango: de lunes a viernes, excepto festivos, desde las 8:00 h hasta las 14:00h y desde las 16:00 hasta las 18:00 h.

b.2) Ninguna voladura superara los 5dB en relación con los niveles límite del apartado a), es decir:

Uso del edificio	Indice de vibración L_{aw}
Vivienda o uso residencial	Inferior o igual a 80
Hospitalario	inferior o igual a 77
Educativo o cultural	inferior o igual a 77

b.3) El conjunto de superaciones de las voladuras del semestre será, en todo caso, inferior a 9 dB. A estos efectos cada voladura cuyo exceso sea inferior a 3dB se contabilizará como 1dB y aquella voladura cuyo exceso esté entre los 3-5 dB se contabilizará como 3 dB.

Hasta el momento, no ha habido producción, la planta todavía no se ha puesto en funcionamiento, por lo que no se han podido medir las vibraciones estacionarias que incluirán las labores diarias y habituales de la actividad.

Este mes no se ha realizado ninguna medición.

3.9. CONTROL DE LOS RESIDUOS (TÓXICOS Y PELIGROSOS).

Para el control de los residuos generados en la explotación que están tipificados como tóxicos y peligrosos, se dispone de la preceptiva autorización como pequeño productor de residuos peligrosos que ya se adjuntó, tramitada ante la agencia de Medio Ambiente, a tenor de lo dispuesto en el Art. 10 del Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos".

También se dispone de contrato con gestor autorizado que ya se adjuntó y no se ha modificado.

3.10. CONTROL DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Tal y como se establece en la DÍA, se debe realizar el control del viento cada vez que se realice una voladura y en la medida de lo posible, se evitará realizar voladuras los días de viento, consultado para ello los partes meteorológicos, para ello la ECMCA ha ubicado una estación meteorológica en las instalaciones de la cantera de Pego, este mes no se ha realizado ninguna voladura.

3.11. CONTROL DE CONDICIONES DE SOSIEGO DE LA POBLACIÓN AFECTADA

Ya se aportó la propuesta inicial del Plan de seguimiento de aceptación social de la actividad "Cantera Adzaila" en el núcleo de l'Atzúbia sobre la que se pretende recabar la aportación y colaboración tanto del Ayuntamiento de l'Atzúbia como de la Asociación Gelibre.

El día 26/07/2023, se mantuvo una primera reunión de toma de contacto en el Ayuntamiento de l'Atzúbia, tal y como se indicó en el segundo Informe de Seguimiento, este mes no ha habido más contactos.

3.12. CONTROL DE LA VEGETACIÓN, FAUNA Y PAISAJE

Cabe indicar que, durante este mes tampoco ha habido producción ya que la planta de tratamiento todavía no se ha puesto en funcionamiento, se han realizado tareas de mantenimiento y puesta a punto, por lo que

ninguno de estos elementos se ha visto afectado, ya se adjuntó cronograma de actuaciones propuesto para su inicio.

4. CONCLUSIONES.

Por todo lo expuesto en la presente Informe Técnico, quedan descritas las actuaciones de Seguimiento y control ambiental realizadas este mes en el que se ha continuado con pruebas y puesta a punto de la instalación Cantera Adzaila, para su evaluación y valoración por los organismos competentes en la materia, así como por aquellas personas afectadas que lo consideren oportuno.

5. ANEXOS

5.1. ANEXO 1. CHECK-LIST

5.2. ANEXO 2. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LABORES

ANEXO 1.

Check-list

CHECK-LIST SEGUIMIENTO Cantera ADZAILA Pago (1ª FASE)

ACTIVIDAD	CONTINUO	DIARIA	SEMANAL	MENSUAL	SEMESTRAL	VOLADURAS	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	Observaciones
Plan de seguimiento y control ambiental				X	X		14/06	04/08	04/09	/				Elaborado Ed.01
Check-list de seguimiento				X	X									/ 3º Registro
Revisión fosa séptica			X											Idem anterior
Evacuación de las aguas residuales a un depósito impermeable y tratamiento por gestor autorizado.*		X												
Plan de labores (seguimiento)				X	X		28/07	28/08						
Inspección visual de los procesos erosivos e inestabilidades				X	X		03/10/23							Informe 03/10/23
Vigilancia del avance de los frentes				X	X		03/10/23							Informe 03/10/23
Estabilización y compactación de pistas de transporte y acopios				X	X		03/10/23							Informe 03/10/23
Riego periódico de pistas de transporte y acopios.*		X												
Planificación y control del tráfico de los vehículos de transporte.*	X	X												
Reducción de la velocidad de circulación, evitando los cruces de pistas.*	X	X												
Mantenimiento de la maquinaria fuera de la zona de trabajo, en un lugar habilitado para ello.*		X												
Vigilancia de la circulación de maquinaria fuera de las zonas no aptas.*	X	X												
Seguimiento de labores de restauración con estado fitosanitario de los individuos (plantas) introducidos				X	X									
Remoción acopios tierra vegetal				X	X									
Limpieza y saneo de zanjas de drenaje				X	X									
Mediciones focos difusos y foco canalizado				X	X									
Control de la presión filtro de mangas.*		X												
Informe medición de emisiones a la atmósfera				X	X									
Medición ruido y vibraciones				X	X									
Informe mediciones de ruido y vibraciones				X	X									
Revisión de la recogida de residuos en el punto limpio y tratamiento por gestor autorizado.*		X												
Recogida selectiva de los residuos de los trabajadores y gestión en origen.*		X												
Control del viento (condiciones meteorológicas)						X								
Seguimiento del plan de seguimiento de aceptación social					X									
Informe medioambiental				X	X		03/10							

* NOTA: En todos los seguimientos de periodicidad diaria, tan solo se anotará cuando haya una incidencia/observación, indicando fecha de esta y su contenido.

ANEXO 2

Informe de seguimiento de labores

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS LABORES

Cantera de "Adzaila" Nº 107 PEGO (Alicante).



Pego, 29 de septiembre de 2023

REDACTORES DEL INFORME	
<p>Guillaume Jourdain Ingeniero Geólogo Responsable Planificación Minera España</p>	<p>Teresa Romero Prieto Ingeniero de Minas Delegada de áridos de Levante Norte</p>

Índice

1.	FRENTES DE EXPLOTACION	3	■
1.1.	VIGILANCIA DEL AVANCE DE LOS FRENTES	3	■
1.2.	PROCESOS EROSIVOS E INESTABILIDADES EN LAS ZONAS EXPLOTADAS	3	■
2.	ZONAS DE CIRCULACION	4	■
2.1.	REACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE TRÁFICO TRAS VARIOS AÑOS PARADAS.....	4	■
2.2.	CONTROL DEL TRÁFICO RODADO (VELOCIDAD, ZONAS DE CIRCULACIÓN)	4	■
3.	ACOPIOS.....	4	■
3.1.	RIEGO DE ACOPIOS.....	4	■
3.2.	ZONAS DE ACOPIOS.....	4	■

1. FRENTES DE EXPLOTACION

1.1. VIGILANCIA DEL AVANCE DE LOS FRENTES

No hay cambios respecto al informe anterior.

1.2. PROCESOS EROSIVOS E INESTABILIDADES EN LAS ZONAS EXPLOTADAS

Respecto a la inestabilidad detectada en el frente Oeste junto a la tolva del primario (señalizada para evitar el paso en sus inmediaciones) que estaba previsto sanear en septiembre, ha sido saneada, tal y como se puede comprobar en las imágenes adjuntas.



Ilustración 1: Pared saneada, antes y después

En caso de observarse, durante los trabajos diarios, cualquier movimiento que pueda comprometer la estabilidad de la plataforma de trabajo, frentes o accesos por parte de cualquier trabajador se comunicara la misma al encargado de forma inmediata, evaluándose la misma a la mayor brevedad llegando a detener los trabajos en este punto hasta la solución de la incidencia detectada.

2. ZONAS DE CIRCULACION

2.1. REACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE TRÁFICO TRAS VARIOS AÑOS PARADAS

Durante este mes, tan solo se ha realizado mantenimiento de toda la zona de tráfico acondiciona anteriormente.

2.2. CONTROL DEL TRÁFICO RODADO (VELOCIDAD, ZONAS DE CIRCULACIÓN)

El plano de circulación tal y como estaba previsto se ha modificado (se adjunta).

3. ACOPIOS

Se han incluido en el plano de circulación.

3.1. RIEGO DE ACOPIOS


No hay cambios respecto al informe anterior.

3.2. ZONAS DE ACOPIOS

Incluidas en el plano de circulación adjunto.



Frente de cantera

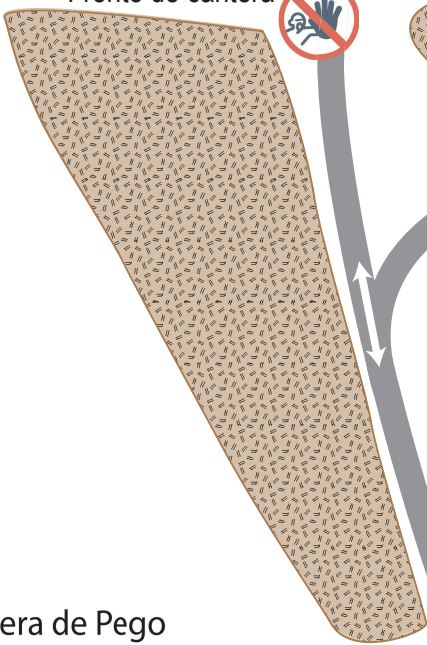

Cantera de Pego

Leyenda

- B Báscula
- Aparcamiento
- Carril Peatonal
- Carril Coches
- Punto de reunión
- Acopios
- Carril Cantera

